

Afspærringer og rækværker

Alle opsatte afspærringer og rækværker skal respekteres.

Er det nødvendigt at fjerne eller flytte afspærringer eller rækværker, så er *du* ansvarlig for, at disse bliver genetableret, så der altid er sikret mod nedstyrtning. Samt skal byggeledelsen adviseres.

Arbejdsområder med åbning i rækværker må aldrig forlades.

Oprydning og renhold

Det er vigtigt, at alle håndværkere rydder op, samt fjerner materialer, støv og værktøj fra arbejdsområderne. Oprydningen skal som minimum udføres efter endt arbejde. Ved rengøring af støvede overflader, skal der anvendes svaber eller støvsuger.

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Yderligere information om byggepladsen kan findes i byggepladsens PSS, som bl.a. findes på infotavlen og byggeledelsens kontor i skurbyen. Husk, at du har pligt til at kende indholdet af PSS, samt vide hvor den er placeret.

Førstehjælpsstationer

Der er opsat førstehjælpsstation ved skurby samt ved indgangen til Skurbyen.

Her findes også en procedure ved ulykker der indeholder vigtige telefonnumre og vejledning til førstehjælp.


Aktion ved ulykke

- Stands ulykken og udsæt ikke dig selv for fare
- Giv livreddende førstehjælp
- Ring **1 1 2** hvis nødvendigt
- Oplys byggepladsens adresse:
Oddesundvej 3, 6715 Esbjerg N
- Vigtigt: Kontakt byggeledelsen
- Se yderligere byggepladsens beredskabsplaner
- Hjertestarter findes i skurbyen, og rundt på pladsen



Tomgang

Der må ikke holdes i tomgang på byggepladsen.

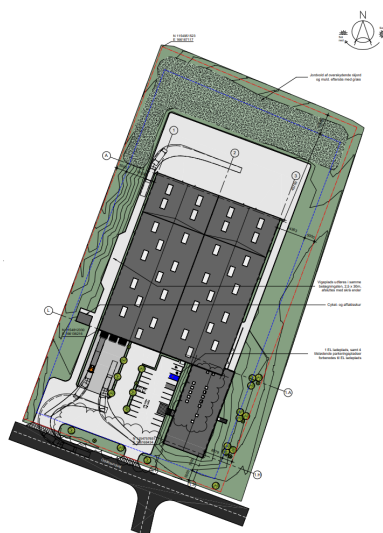

DS Flexhal

Ved spørgsmål, kontakt: Arbejds miljøkoordinator

Andreas K. S. Bertram; tlf: 60 29 45 80; akb@ds-flexhal.dk

God arbejdslyst!

Velkommen til Byggepladsen Sydvesta Esbjerg

Projekt 20728

En byggeplads med sikkerheden i centrum



SYDVESTA
VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

Denne pjece er tilgængelig for alle håndværkere og leverandører, der opholder sig eller arbejder på Byggepladsen "Sydvesta Esbjerg"



DS Flexhal

11-04-2024

Velkommen til en sikker byggeplads

Velkommen til Byggepladsen – Sydvesta Esbjerg

Med denne velkomstpjece, vil vi fortælle dig om de regler og vejledninger, som skal følges, når du arbejder på byggepladsen.

Adgangsveje

Der er opsat en infotavle ved indgangen til skurbyen. Infotavlen indeholder en oversigttegning over adgangsveje for gående og kørende. Orientér dig om flugtveje, før du påbegynder dit arbejde.

Der skal altid sikres mod fald og snublen på adgangsveje:

- Kabler, rør og materialer skal altid placeres hensigtsmæssigt
- Huller og opragende emner skal altid afdækkes eller afspærres

Støj og vibrationer

Myndigheds- og lovkrav for støjende og vibrerende arbejder skal være overholdt. Det er den enkeltes ansvar at sikre at krav til tidspunkter for støjende arbejder overholdes og at der anvendes mindst støjende metode for arbejdet. Der henvises til Esbjerg Kommunes støjregler. Ved støjende aktiviteter, imellem tidsrummet 18.00 – 07.00, skal arbejdet koordineres med byggeledelsen (DS Flexhal) og arbejdsmiljøkoordinator. Se i øvrigt PSS for byggepladsen.

Støv

Arbejdsmiljøkrav til håndtering af støv på byggepladsen skal være overholdt. Det er den enkeltes ansvar at sikre at krav overholdes. Ved støvende aktiviteter, skal der anvendes mekanisk udsugning. Husk, at der ved sundhedsskadeligt støv, altid skal være afkast til det fri.

Miljøbeskyttelse

Jord og overfladevand på byggepladsen skal beskyttes mod skadelig kemi. Kemi skal opbevares i dertil egnede containere eller varevogne på byggepladsen. Kemi opbevaret uden for container eller biler skal stå på et befæstet underlag.

Skæring/slibning med vinkelsliber indendørs

Husk, at der ved arbejde med vinkelsliber, skal:

- Etableres udsugning
- Sikres, at der ikke foregår andet arbejde i nærheden
- Sikre, at der ikke kan antændes materialer eller lign.
- Totalafdækkes på færdigt gulv

Stiger

Undgå så vidt muligt stigearbejder; brug lift eller rullestillads. Ved stigearbejde, bør der altid være en respektafstand til rækværker på stigelængde + 1 m.

Rullestilladser

På byggepladsen, skal der på alle rullestilladser, uanset platformshøjde, være:

- Håndlister hele vejen rundt om platform i én
- meters højde over platform
- Knælister i 50 cm over platform
- 15 cm høje fodlister rundt på platform

Lifte

Ved anvendelse af lift, skal arbejdet altid udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det skal sikres, at:

- Der ikke køres over kabler eller lignende
- Underlaget er plant og stabilt
- Arbejdsområdet er afspærret; det er dit ansvar, at der ikke er nogen under dig, når du arbejder fra lift
- Sele anvendes jf. leverandørens brugsanvisning

Personlige værnemidler

Ved arbejde og færdsel på byggepladsen, skal der som minimum anvendes godkendt hjelm, signaltøj og værnefodtøj.



Affaldshåndtering

Det er vigtigt at alt byggeaffald bliver sorteret efter de gældende regler og krav for projektet og der er opstillet containere på byggepladsen til div. fraktioner, det fremgår af skiltning.

Husholdningsaffald skal håndteres forsvarligt; dette indebærer opbevaring i de opstillede lukkede containere/beholdere ved skurbyen og fremgår af skiltning.

I forbindelse med at projektet skal DGNB-certificeres, er det et krav at alt affald skal sorteres i forhold til de opstillede containere/beholdere med tilhørende skiltning.

Der er oprettet en genbrugsplads, hvor eventuelle overskuds-materialer kan afsættes til glæde for øvrige entreprenører, der kan bruge disse.

Bæredygtighedskrav

Da projektet skal DGNB-certificeres skal der, udover sortering af affald, fokuseres på følgende:

- Minimere transport af materialer/produkter
- Forebyggelse og afhjælpning af fugt i materialerne
- Undgå unødvendigt brug af strøm og vand i skurene

Varmt arbejde

Husk, at melde varmt arbejde til byggeledelsen, når nedenstående arbejder udføres.

- Krympning af isolering omkring kabler m.m.
- Membran- og tagpaparbejder med brug af åben ild
- Skæring og slibning med vinkelsliber
- Svejsning og skærebredning

Husk at medbringe egne brandslukkere, og at de skal være anbragt inden for 5 m fra arbejdsstedet. Husk også at gå brandvagt 60 min efter endt arbejde.
