Projektering- og udførelsestidsplan
Sag: 230301 - Sydvesta, Esbjerg

DS Flexhal

Dato: 20-06-2023
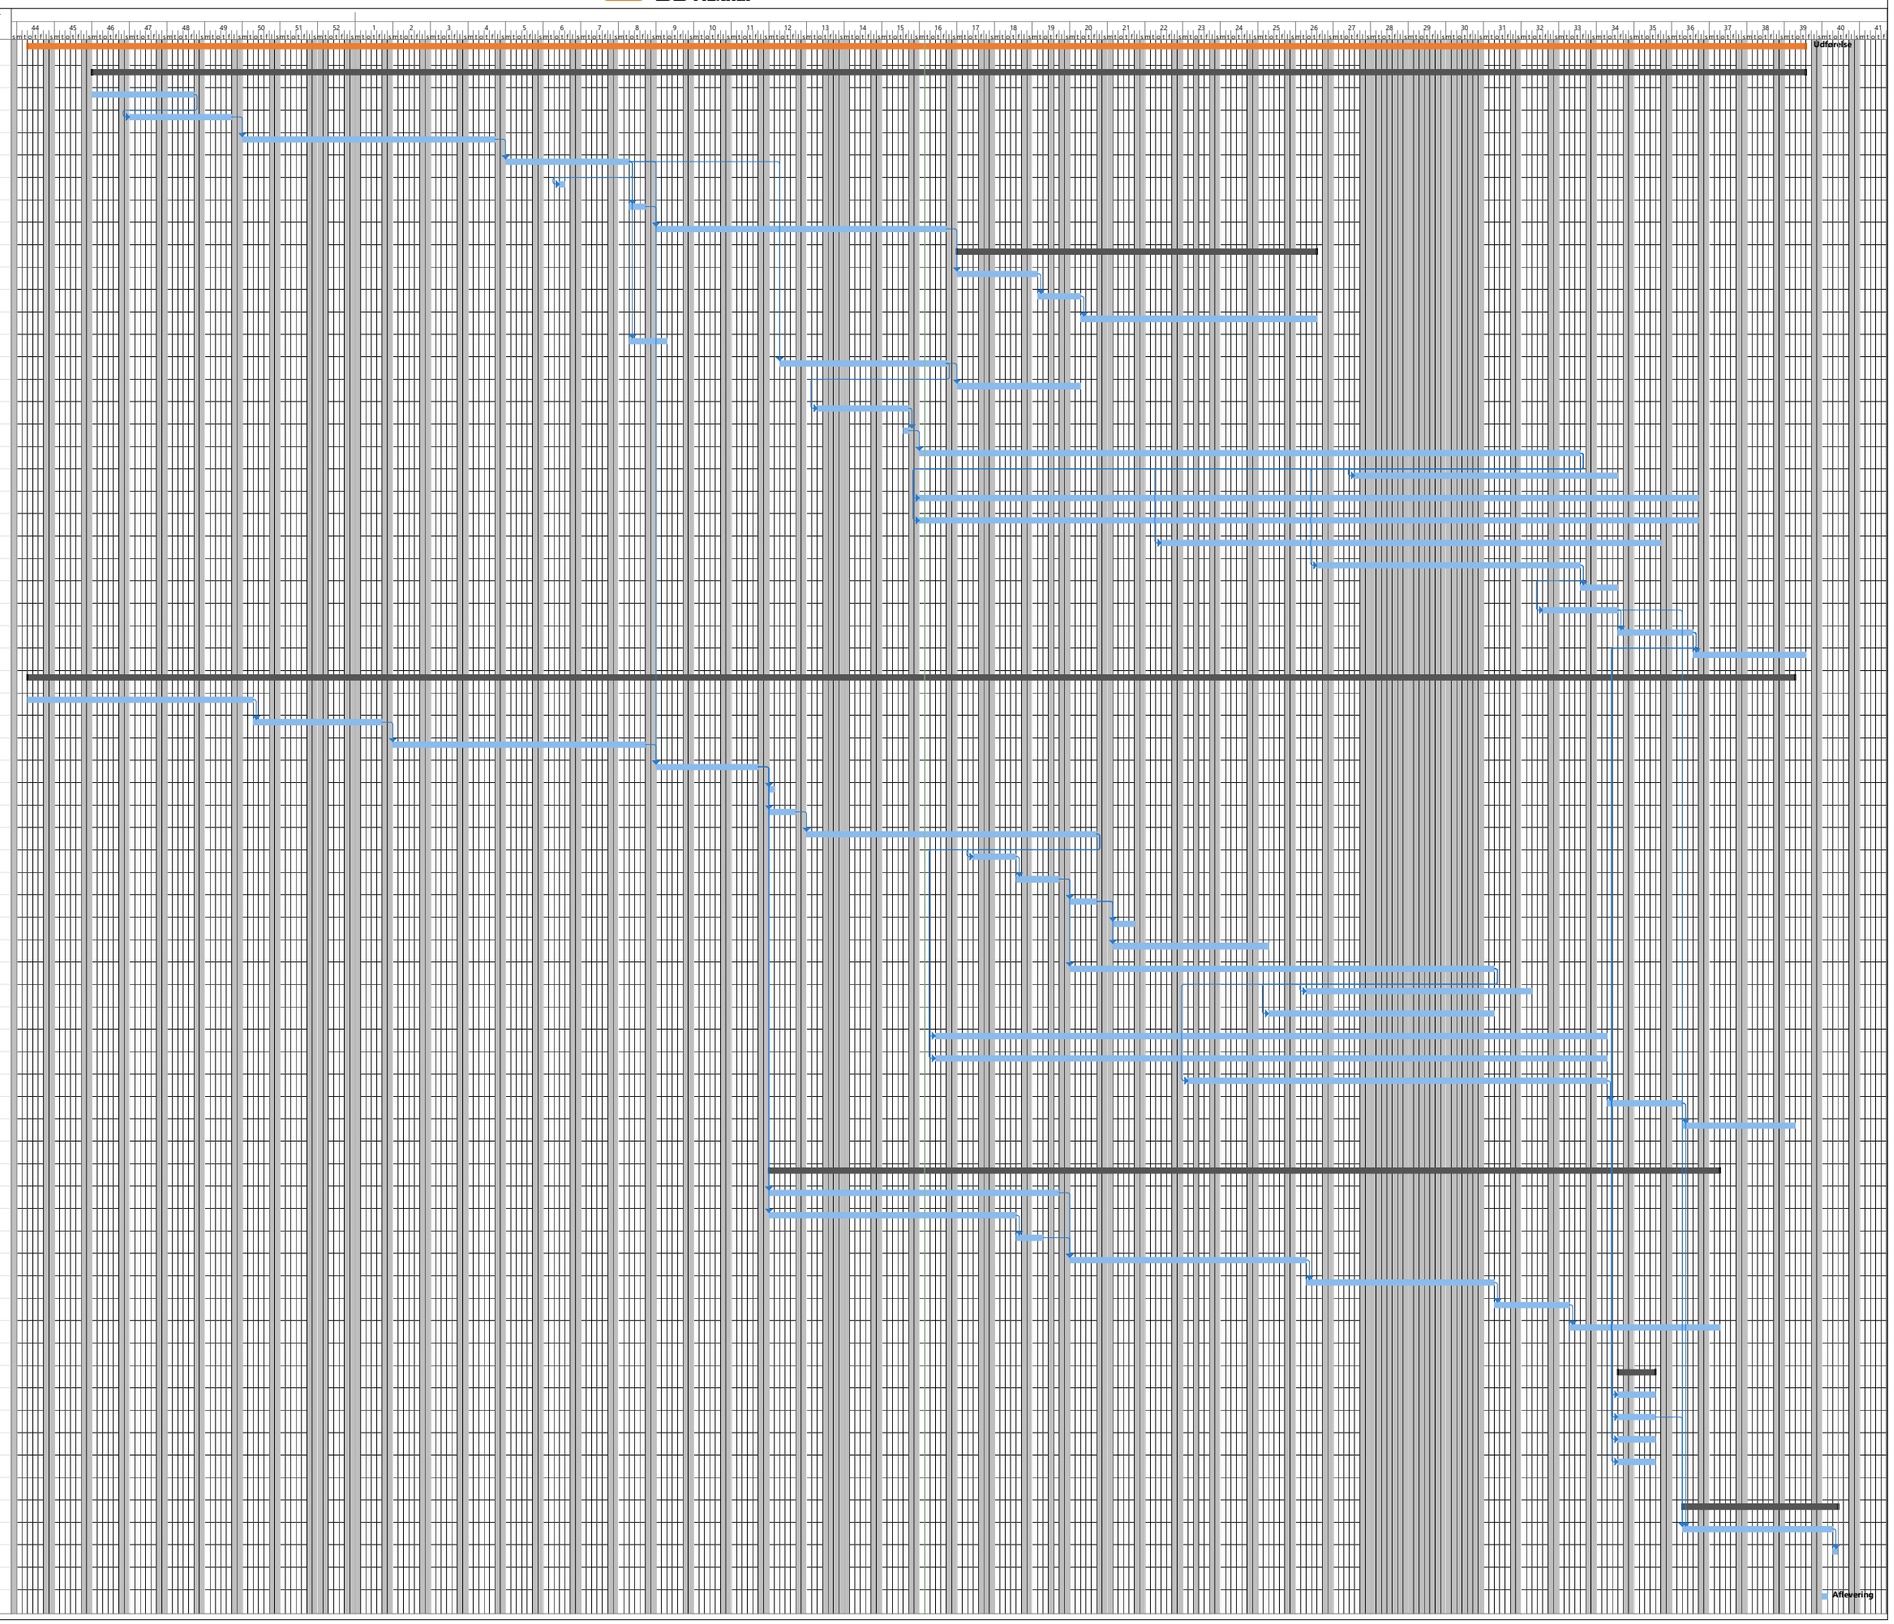
Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1	**UDFØRELSE PÅ PLADSEN**	**212 dage**	**on 01-11-23**	**to 26-09-24**	
2	**ADM**	**204 dage**	**ma 13-11-23**	**to 26-09-24**	
3	Terrænregulering incl. Bundopbygninger	15 dage	ma 13-11-23	fr 01-12-23	
4	Kloakarbejder under bygning	15 dage	ma 20-11-23	fr 08-12-23	3AS-10 dage
5	Støbning af Fundamenter i Kælder	32 dage	ma 11-12-23	fr 26-01-24	4
6	Elementmontage	17 dage	ma 29-01-24	ti 20-02-24	5
7	Stålmontage	1 dag	to 08-02-24	to 08-02-24	6AS-9 dage
8	Funing og tætning af kæller	3 dage	on 21-02-24	fr 23-02-24	6
9	Opfyld rundt om kæller	37 dage	ma 26-02-24	fr 19-04-24	8
10	**Tømrerarbejder udv.**	**45 dage**	**ma 22-04-24**	**to 27-06-24**	
11	Let Konstruktion ved Tresse	10 dage	ma 22-04-24	ma 06-05-24	9
12	Loft Konstruktion ved Tresse	5 dage	ti 07-05-24	ti 14-05-24	11
13	Steni Plader	30 dage	on 15-05-24	to 27-06-24	12
14	montage af ovenlys	5 dage	on 21-02-24	ti 27-02-24	6
15	Tagdækning Iso og tagpap	20 dage	on 20-03-24	fr 19-04-24	6AS+20 dage
16	Vinduer og udv.	15 dage	ma 22-04-24	ti 14-05-24	15
17	Betongulve Kælder	10 dage	on 27-03-24	fr 12-04-24	15AS-15 dage
18	Slidlag stuen	1 dag	fr 12-04-24	fr 12-04-24	17AS-1 dag
19	Indv. Tømrerarbejder	70 dage	ma 15-04-24	to 15-08-24	18
20	Murer	20 dage	fr 05-07-24	to 22-08-24	19AS-15 dage
21	EL	86 dage	ma 15-04-24	fr 06-09-24	19AS-70 dage
22	VVS	86 dage	ma 15-04-24	fr 06-09-24	19AS-70 dage
23	Ventilation	51 dage	to 30-05-24	fr 30-08-24	19AS-40 dage
24	Maler	20 dage	fr 28-06-24	to 15-08-24	19AS-20 dage
25	Solafskærming og gadiner	5 dage	fr 16-08-24	to 22-08-24	24
26	Gulvbelægninger	10 dage	fr 09-08-24	to 22-08-24	24AS-5 dage
27	Test og indregulering	10 dage	fr 23-08-24	to 05-09-24	26
28	Mangel afhjælpning	15 dage	fr 06-09-24	to 26-09-24	27
29	**Haler**	**210 dage**	**on 01-11-23**	**ti 24-09-24**	
30	Terrænregulering incl. Bundopbygninger	30 dage	on 01-11-23	ti 12-12-23	
31	Kloakarbejder under bygning	15 dage	on 13-12-23	fr 05-01-24	30
32	Støbning af Fundamenter	35 dage	ma 08-01-24	fr 23-02-24	31
33	Elementmontage	15 dage	ma 26-02-24	fr 15-03-24	6AS-5 dage;32
34	Stålmontage	1 dag	ma 18-03-24	ma 18-03-24	33
35	Trapez montage	5 dage	ma 18-03-24	fr 22-03-24	33
36	Tagdækning	35 dage	ma 25-03-24	fr 17-05-24	35
37	Slidlag mezzanin	5 dage	to 25-04-24	to 02-05-24	36AS-15 dage
38	Betongulve Velfær	5 dage	fr 03-05-24	fr 10-05-24	37
39	Betongulve Hal	5 dage	ma 13-05-24	fr 17-05-24	38
40	Betonforplader	4 dage	ti 21-05-24	fr 24-05-24	39
41	Vinduer og udv. Døre samt port	20 dage	ti 21-05-24	ti 18-06-24	39
42	Indv. Tømrerarbejder	40 dage	ma 13-05-24	ti 30-07-24	38
43	Maler	15 dage	on 26-06-24	ti 06-08-24	42AS-10 dage
44	Murer	15 dage	on 19-06-24	ti 30-07-24	42AS-15 dage
45	EL	70 dage	to 18-04-24	ti 20-08-24	36AS-20 dage
46	VVS	70 dage	to 18-04-24	ti 20-08-24	36AS-20 dage
47	Ventilation	40 dage	ti 04-06-24	ti 20-08-24	42AS-25 dage
48	Test og indrgulering	10 dage	on 21-08-24	ti 03-09-24	47
49	Mangel afhjælpning	15 dage	on 04-09-24	ti 24-09-24	48
50					
51	**Udvenigarbejdter**	**105 dage**	**ma 18-03-24**	**ti 10-09-24**	
52	Kantsten	35 dage	ma 18-03-24	fr 10-05-24	33
53	Støtte murere	30 dage	ma 18-03-24	to 02-05-24	33
54	Udvendig beton plade	3 dage	fr 03-05-24	ti 07-05-24	53
55	Belegning	30 dage	ma 13-05-24	ti 25-06-24	52;54
56	lys i træning	10 dage	on 26-06-24	ti 30-07-24	55
57	Udlægning af muld	10 dage	on 31-07-24	ti 13-08-24	56
58	Grassåning	20 dage	on 14-08-24	ti 10-09-24	57
59					
60	**Indsamling af dokumentation til ibrugtagning**	**5 dage**	**fr 23-08-24**	**to 29-08-24**	
61	Brand sluterklæring	5 dage	fr 23-08-24	to 29-08-24	27AS-10 dage
62	Statik sluterklæring	5 dage	fr 23-08-24	to 29-08-24	27AS-10 dage
63	Energimærkning	5 dage	fr 23-08-24	to 29-08-24	27AS-10 dage
64	Drift og vedligeholdsdokumenter	5 dage	fr 23-08-24	to 29-08-24	27AS-10 dage
65					
66	**Myndigheder**	**21 dage**	**on 04-09-24**	**on 02-10-24**	
67	Behandling af ibrugtagningstilladelse ved myndigheder	20 dage	on 04-09-24	ti 01-10-24	48;26;62
68	Ibrugtagningstilladelse	1 dag	on 02-10-24	on 02-10-24	67
69					
70	**Aflevering og ibrugtagning**	1 dag	ma 30-09-24	ma 30-09-24
